

西貢區議會地區設施管理委員會
(2019 年 9 月 10 日 - 第五次會議)

香港單車館公園與環保大道之間的單車徑水管敷設工程之建議運輸路線

目的

就「水務署工程合約編號 13/WSD/16 – 將軍澳水管敷設工程」，在香港單車館公園與環保大道之間的單車徑進行水管敷設工程，鑑於建議運輸路線有需要途經香港單車館公園範圍，水務署自 2019 年 4 月開始徵詢康樂及文化事務署 (康文署) 的同意。由於香港單車館公園屬於本港標誌性的體育及康樂場所，水務署考慮到公眾對工程的關注，特此在地區設施管理委員會上介紹相關運輸路線建議書，以徵詢各委員的意見。

背景

水務署已於 2017 年 11 月展開一項水管敷設工程，包括敷設一條長約 10 公里、直徑 1200 毫米的食水管，目的為連接擬建將軍澳海水化淡廠和現有將軍澳主食水配水庫。工程預計 2022 年第二季完成。此項工程由五洋協力聯營承接。

自 2017 年底始，水務署及承建商按原擬水管走線進行資料搜集及研究施工方案。根據勘察結果顯示，原擬水管走線途經的寶邑路地下滿佈公用設施，而且原擬水管走線途經的寶康路屬於區內主要交通幹道，因此在該路段施工時預計會引起交通擠塞。此外，毗鄰寶康路有多個屋苑，施工期間亦難免產生不少噪音和泥塵滋擾，實屬不理想。

基於上述考量，為減低工程對市民造成的滋擾及改善施工進度，將原擬水管走線更改至香港單車館公園與環保大道之間的單車徑（見附圖 13WSD16_SK116_1_2B）是目前最為妥善和理想的方案，而此替代水管走線方案既可縮減水管敷設長度約 500 米，繼而縮短工期大概 4 個月，亦能舒緩寶康路的交通壓力，更可以減少因工程而對附近居民所造成的噪音及泥塵滋擾。

水務署於 2019 年初分別向不同持份者包括受本工程影響的當區議員和單車會簡介上述替代水管走線方案，並獲得原則上的支持。由於建議運輸路線有需要途經香港單車館公園範圍，本署自 2019 年 4 月開始便與康文署進行討論及篩選各種可行的運輸路線方案，以至得出兩個建議運輸路線方案予委員參考及選取。

建議運輸路線選項內容

在選取可行的運輸路線方案過程中，水務署與康文署考慮了不同方面的因素包括公園場地內的公眾安全、公園設施和結構的影響、單車徑使用者和行人的影響、

行車交通的影響，以及相對應的施工程序及工期等。平衡了各項因素後，水務署與康文署得出以下兩個建議運輸路線方案（見附圖 運輸路線示意圖）：

	選項(1)	選項(2)
內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 共 2 條建議運輸路線 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 將軍澳運動場外通道 ➢ 寶康路及寶順路單車徑 	<ul style="list-style-type: none"> ● 共 3 條建議運輸路線 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 將軍澳運動場外通道 ➢ 寶康路及寶順路單車徑 ➢ 寶邑路單車徑
	<ul style="list-style-type: none"> ● 將軍澳運動場外通道運輸時間限制於星期一至六，由上午 8 時至下午 6 時（工程需配合香港單車館活動及賽事，公眾假期除外） 	
特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 對單車徑的使用人士及行人影響較小 	<ul style="list-style-type: none"> ● 對單車館公園使用者的影響較小 ● 單車館公園封路的日數少約 2 個月
	<ul style="list-style-type: none"> ● 將軍澳運動場外通道將以水馬作圍封，以便進行人車分隔 	
影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 對單車館公園使用者的影響較大 	<ul style="list-style-type: none"> ● 對單車徑的使用人士及行人影響較大
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用單車徑進出時會影響寶康路的交通 ● 單車徑路面長和窄，倒車行駛時會增加對單車使用人士及行人的安全風險 ● 在單車館公園內需臨時移去部份花槽、2 棵樹木及 4 張座椅 	

工程滋擾的緩減措施

- 車速限制須維持在每小時 3 公里或以下
- 承建商會確保車輛出入工地時有工人在前後帶領，以免對公眾安全構成威脅
- 須執行有關部門的樹木移植或保護要求（如適用）
- 工程期間須確保單車館公園通道整潔
- 工程需配合香港單車館活動及賽事的需要，會適時臨時移開水馬及欄柵
- 工程期間會為水馬進行裝飾，以美化環境
- 工程完成後，須還原臨時移開或損毀的設施/路面
- 設立工程熱線（電話：9732 8211），方便公眾查詢或反映意見

預計施工日期


2019 年第四季

徵詢意見

請委員考慮上述建議運輸路線選項並選取合適的方案，以便本署儘快實地執行。

水務署

2019 年 9 月

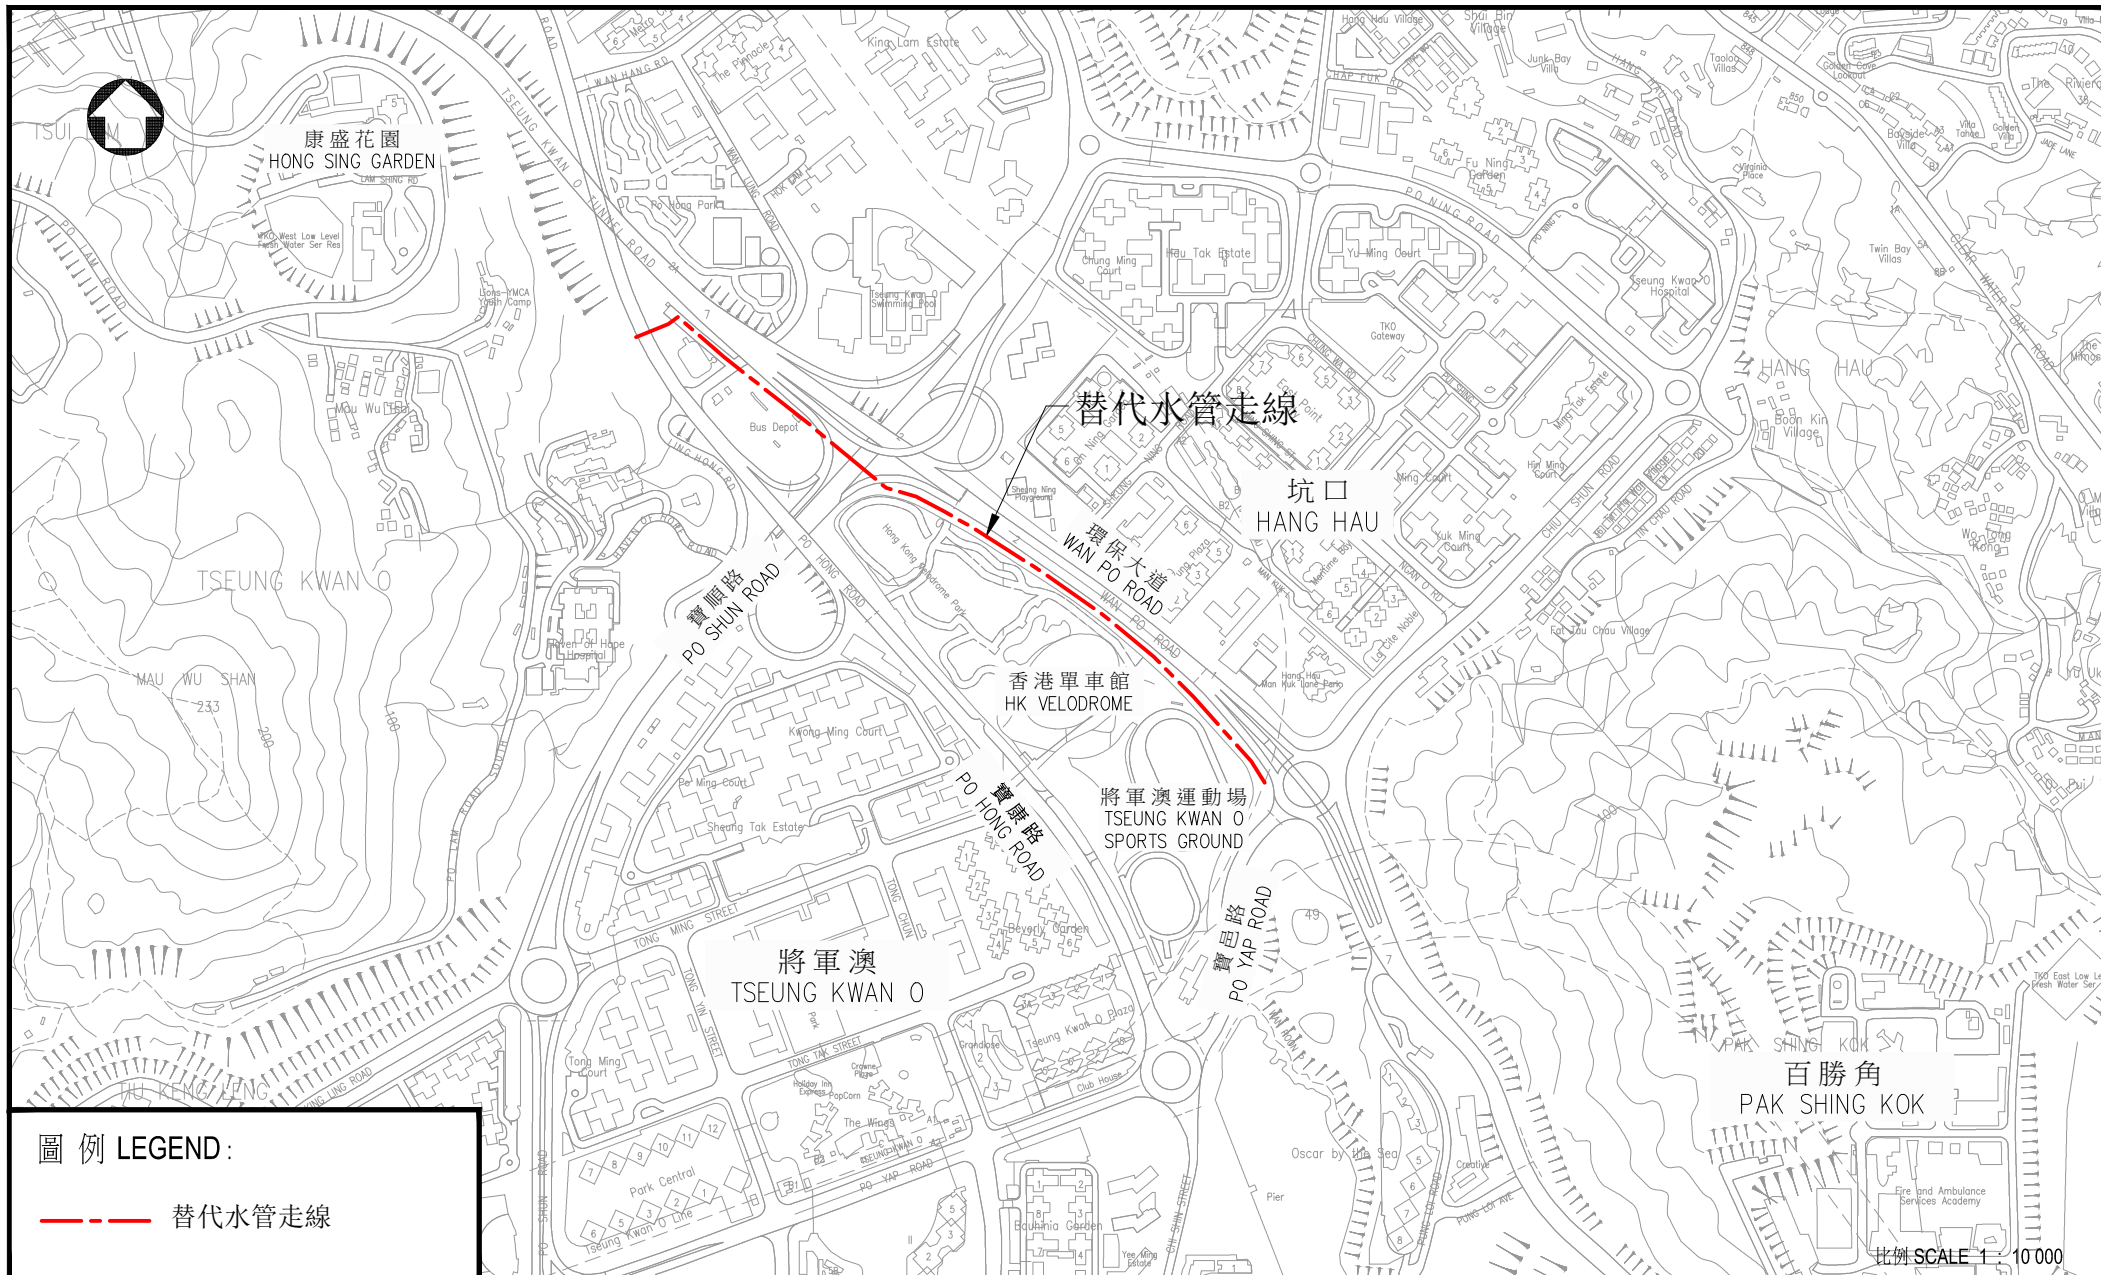

水務署工程合約編號 **13/WSD/16** – 將軍澳水管敷設工程
於香港單車館公園與環保大道之間的單車徑之替代水管走線

 水務署
WATER SUPPLIES DEPARTMENT

草圖編號 13WSD16_SK116_1_2B
SKETCH NO.

REF. 13WSD16_SK116_1_2B.dwg

運輸路線示意圖

